
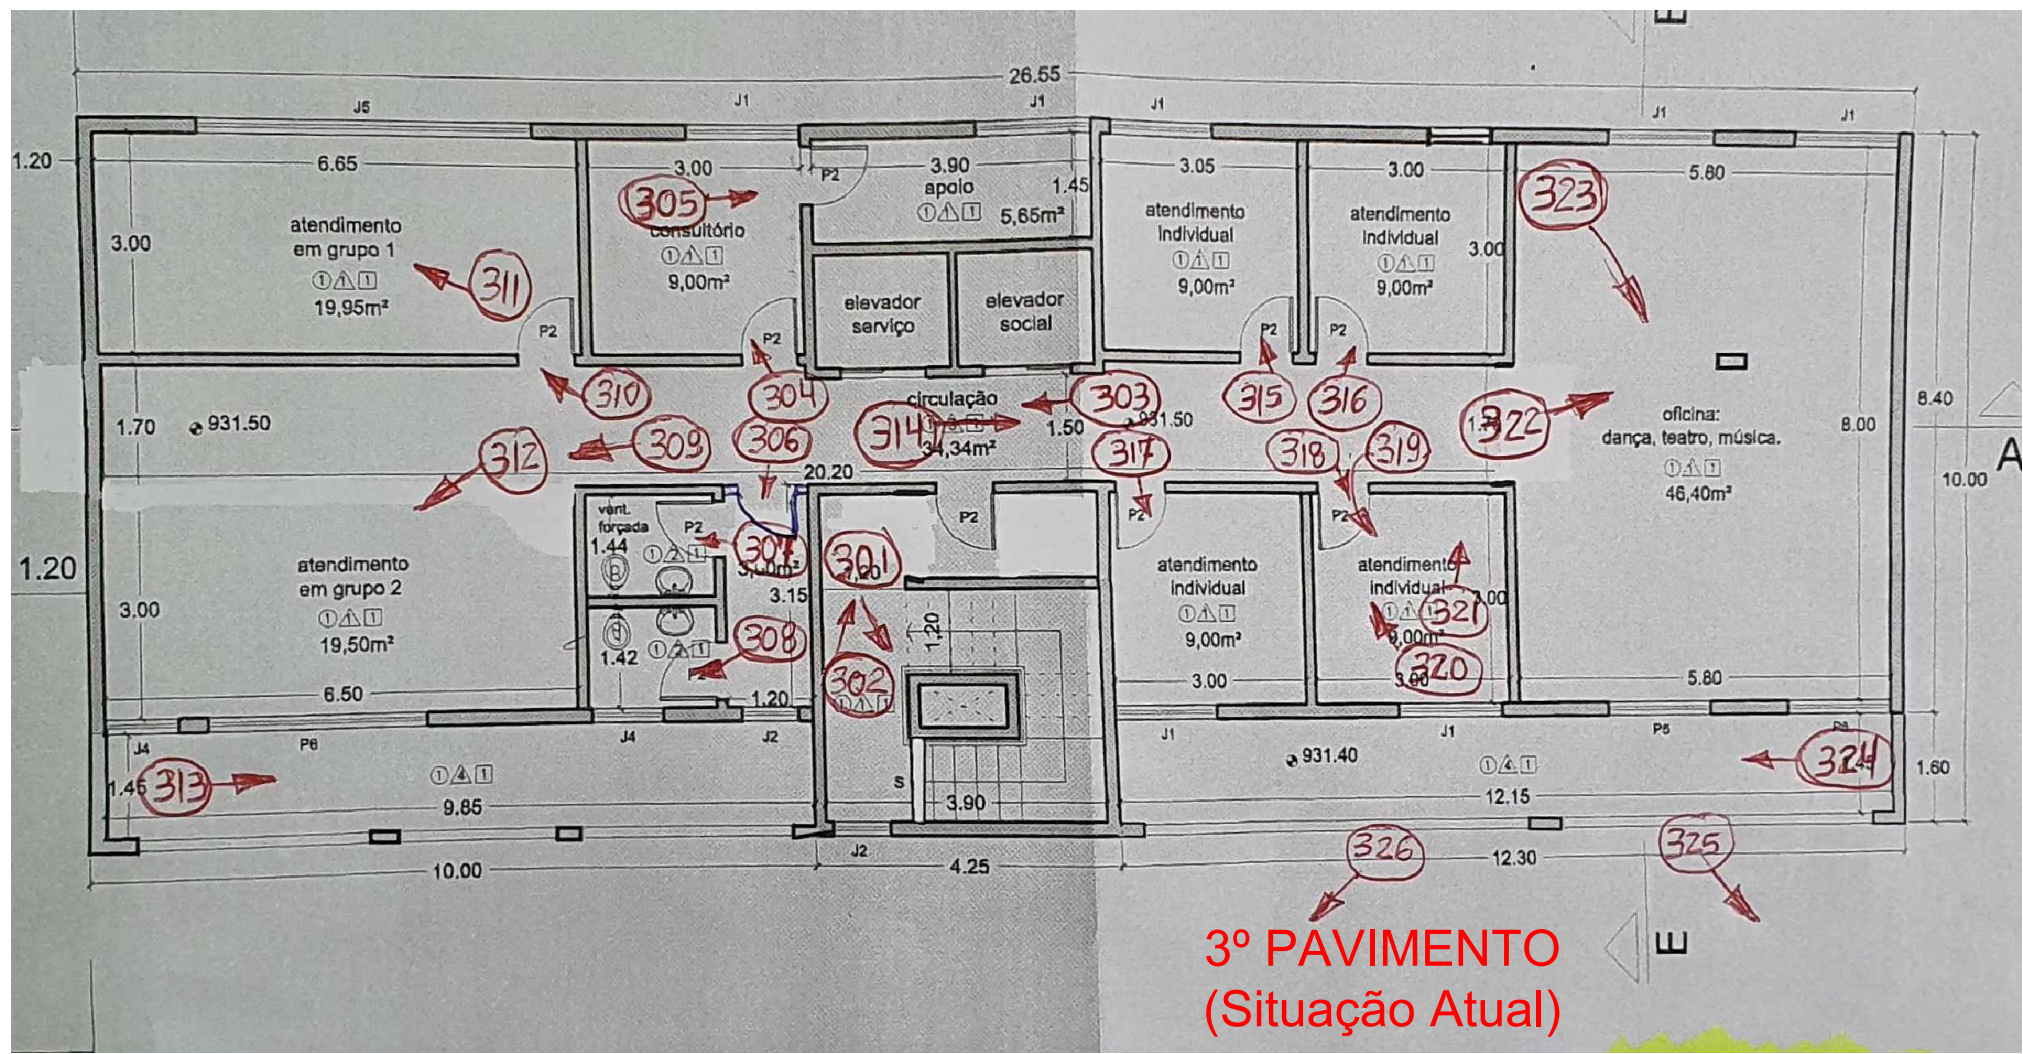
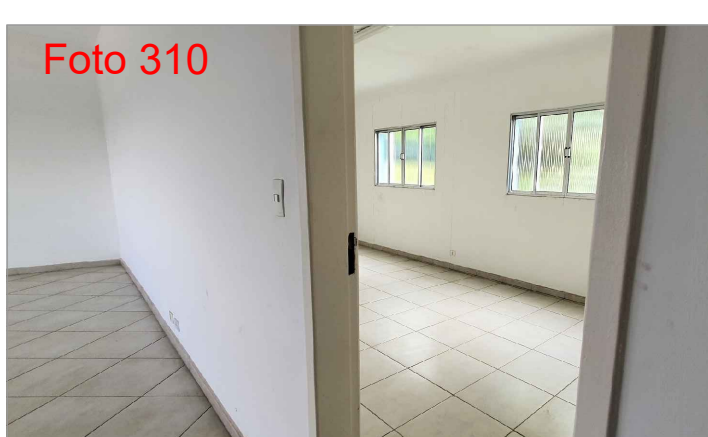
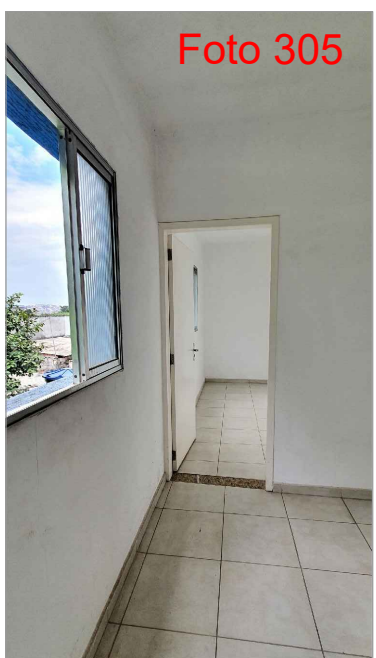
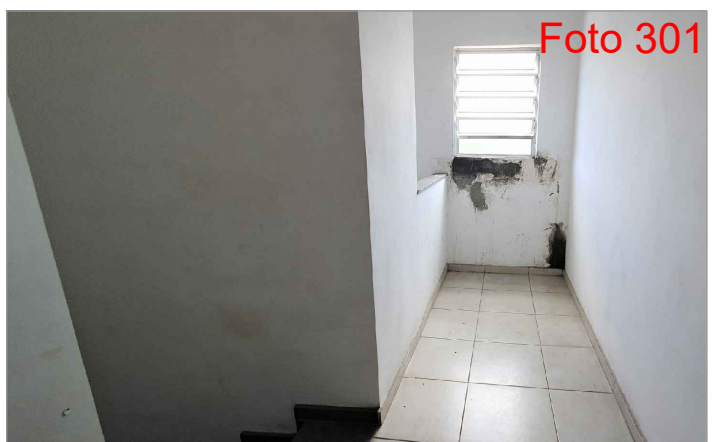
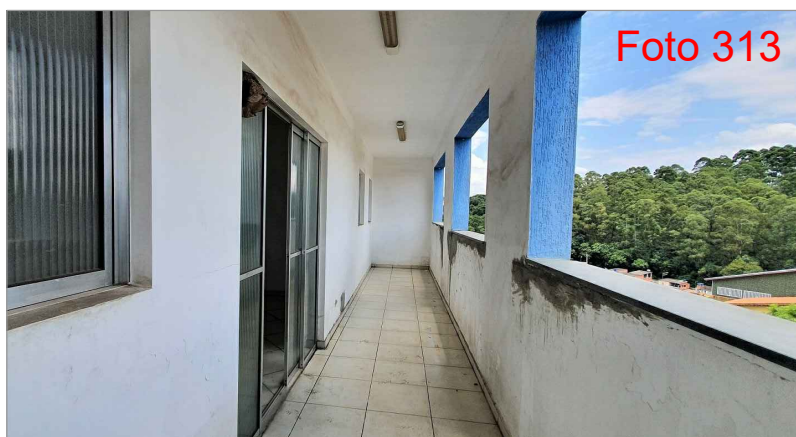
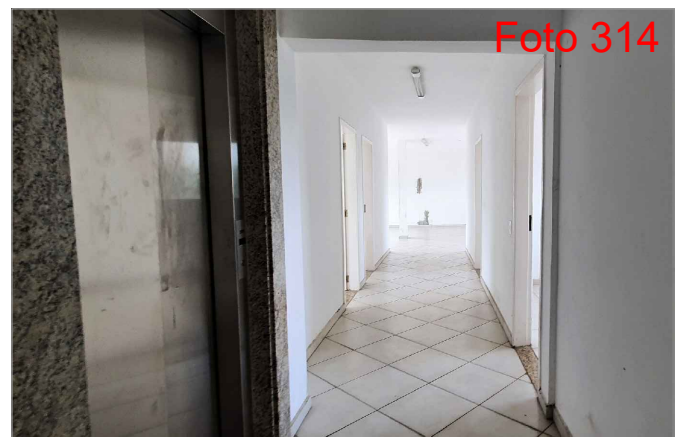


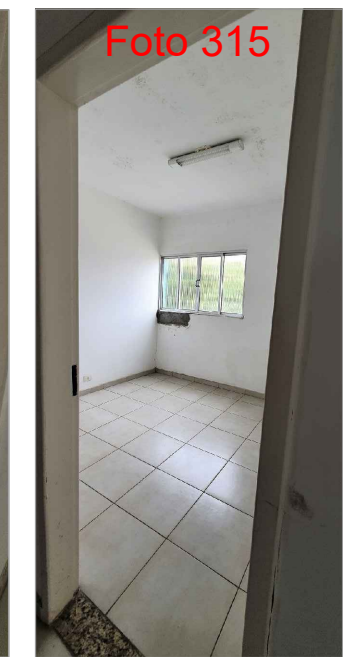

- Construir Paredes de DryWall.
- Instalar Portas (Largura 0,90 m).

- Infiltração pelas Janelas (efetuar Manutenção na Vedação das Janelas).
- Parede com Umidade.
- Tratar Alvenaria Contra Umidade.
- Refazer a Pintura Interna.

- Forro da Laje com Umidade.
- Tratar Contra Umidade.
- Refazer a Pintura Interna.

*** OBS.**
-> Paredes e Tetos (Em Geral) estão com UMIDADE.

- Tratar **TODAS** as Alvenarias Contra Umidade.
- Refazer **TODAS** as Pinturas Internas.
- Infiltração em algumas Janelas (efetuar Manutenção na Vedação da Janela, onde for necessário).

- Demolir / Abrir 2 Vãos de Passagem (Refazer Acabamentos).
- Instalar 2 Portas.
- Construir 2 Paredes.
- Revestir Paredes e colocar Azulejos.
- Instalar 2 Chuveiros (Hidráulica + Elétrica).
- Elevar Piso (Instalar 2 Caixas Sifonadas + Esgoto).
- Instalar 2 Janelas.

- Mudar Porta (Inverter lado de abertura).
- Demolir Parede.
- Construir Parede de DryWall (Resistente a Umidade).
- Construir 4 Box + 4 Portas (2 p/ Sanitários + 2 p/ Chuveiros).
- Instalar Nova Janela (Mudar a localização).
- Revestir Paredes e colocar Azulejos.
- Instalar 2 Chuveiros (Hidráulica + Elétrica).
- Instalar 2 Bacias Sanitárias c/ Cx. Acoplada (Hidráulica + Esgoto).
- Elevar Piso (Instalar Caixas Sifonadas + Esgoto).
- Instalar 2 Pias + 2 Torneiras (Hidráulica + Esgoto).
